



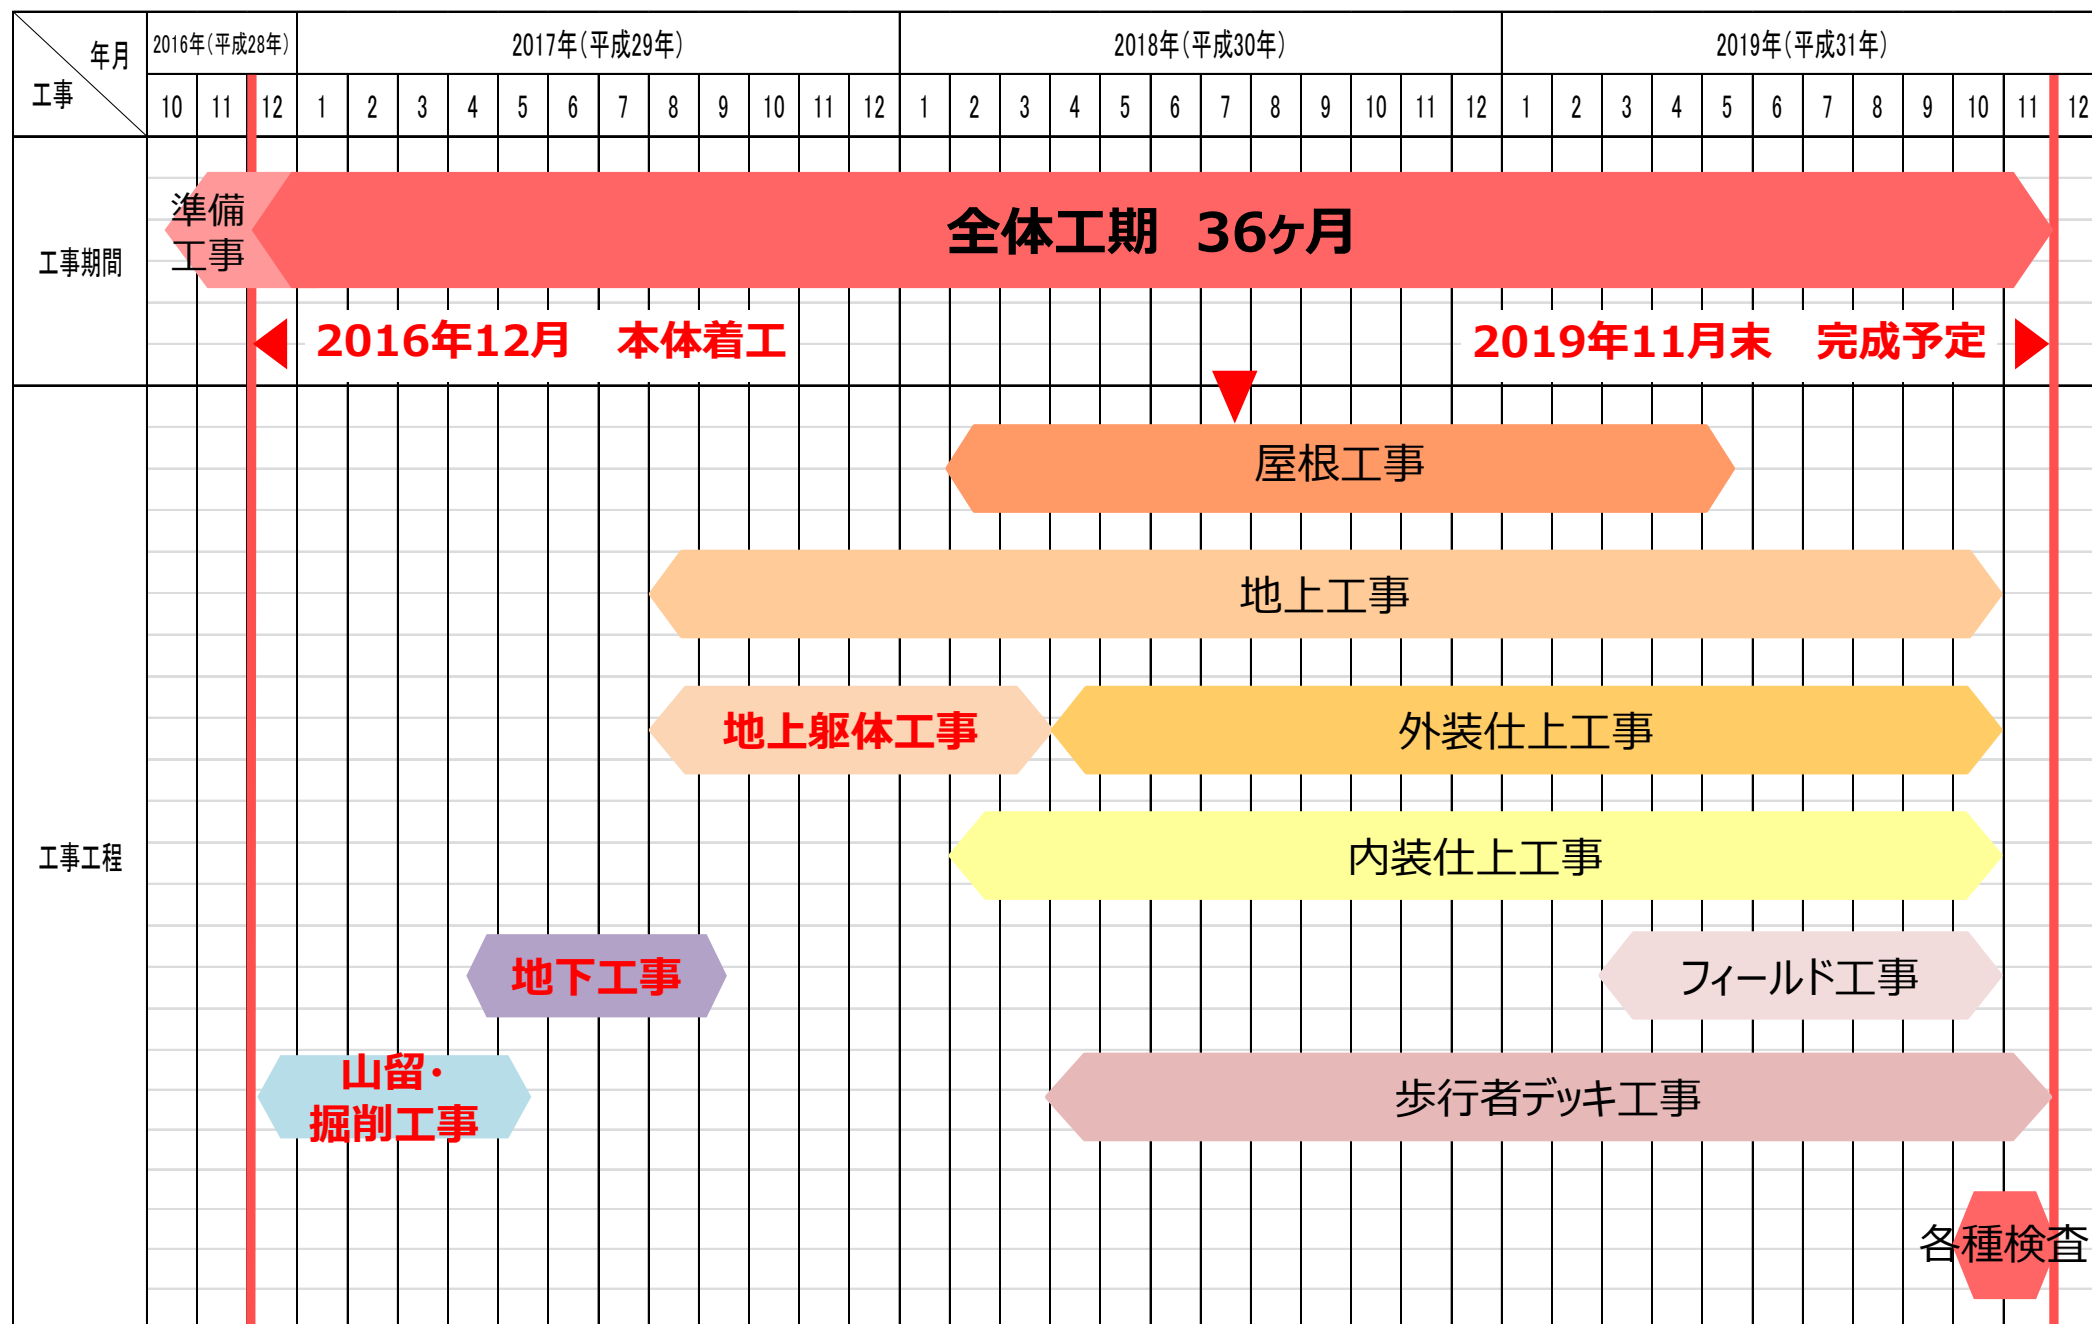


※本工程は、現時点における予定です。


工事進捗状況① 建物全体

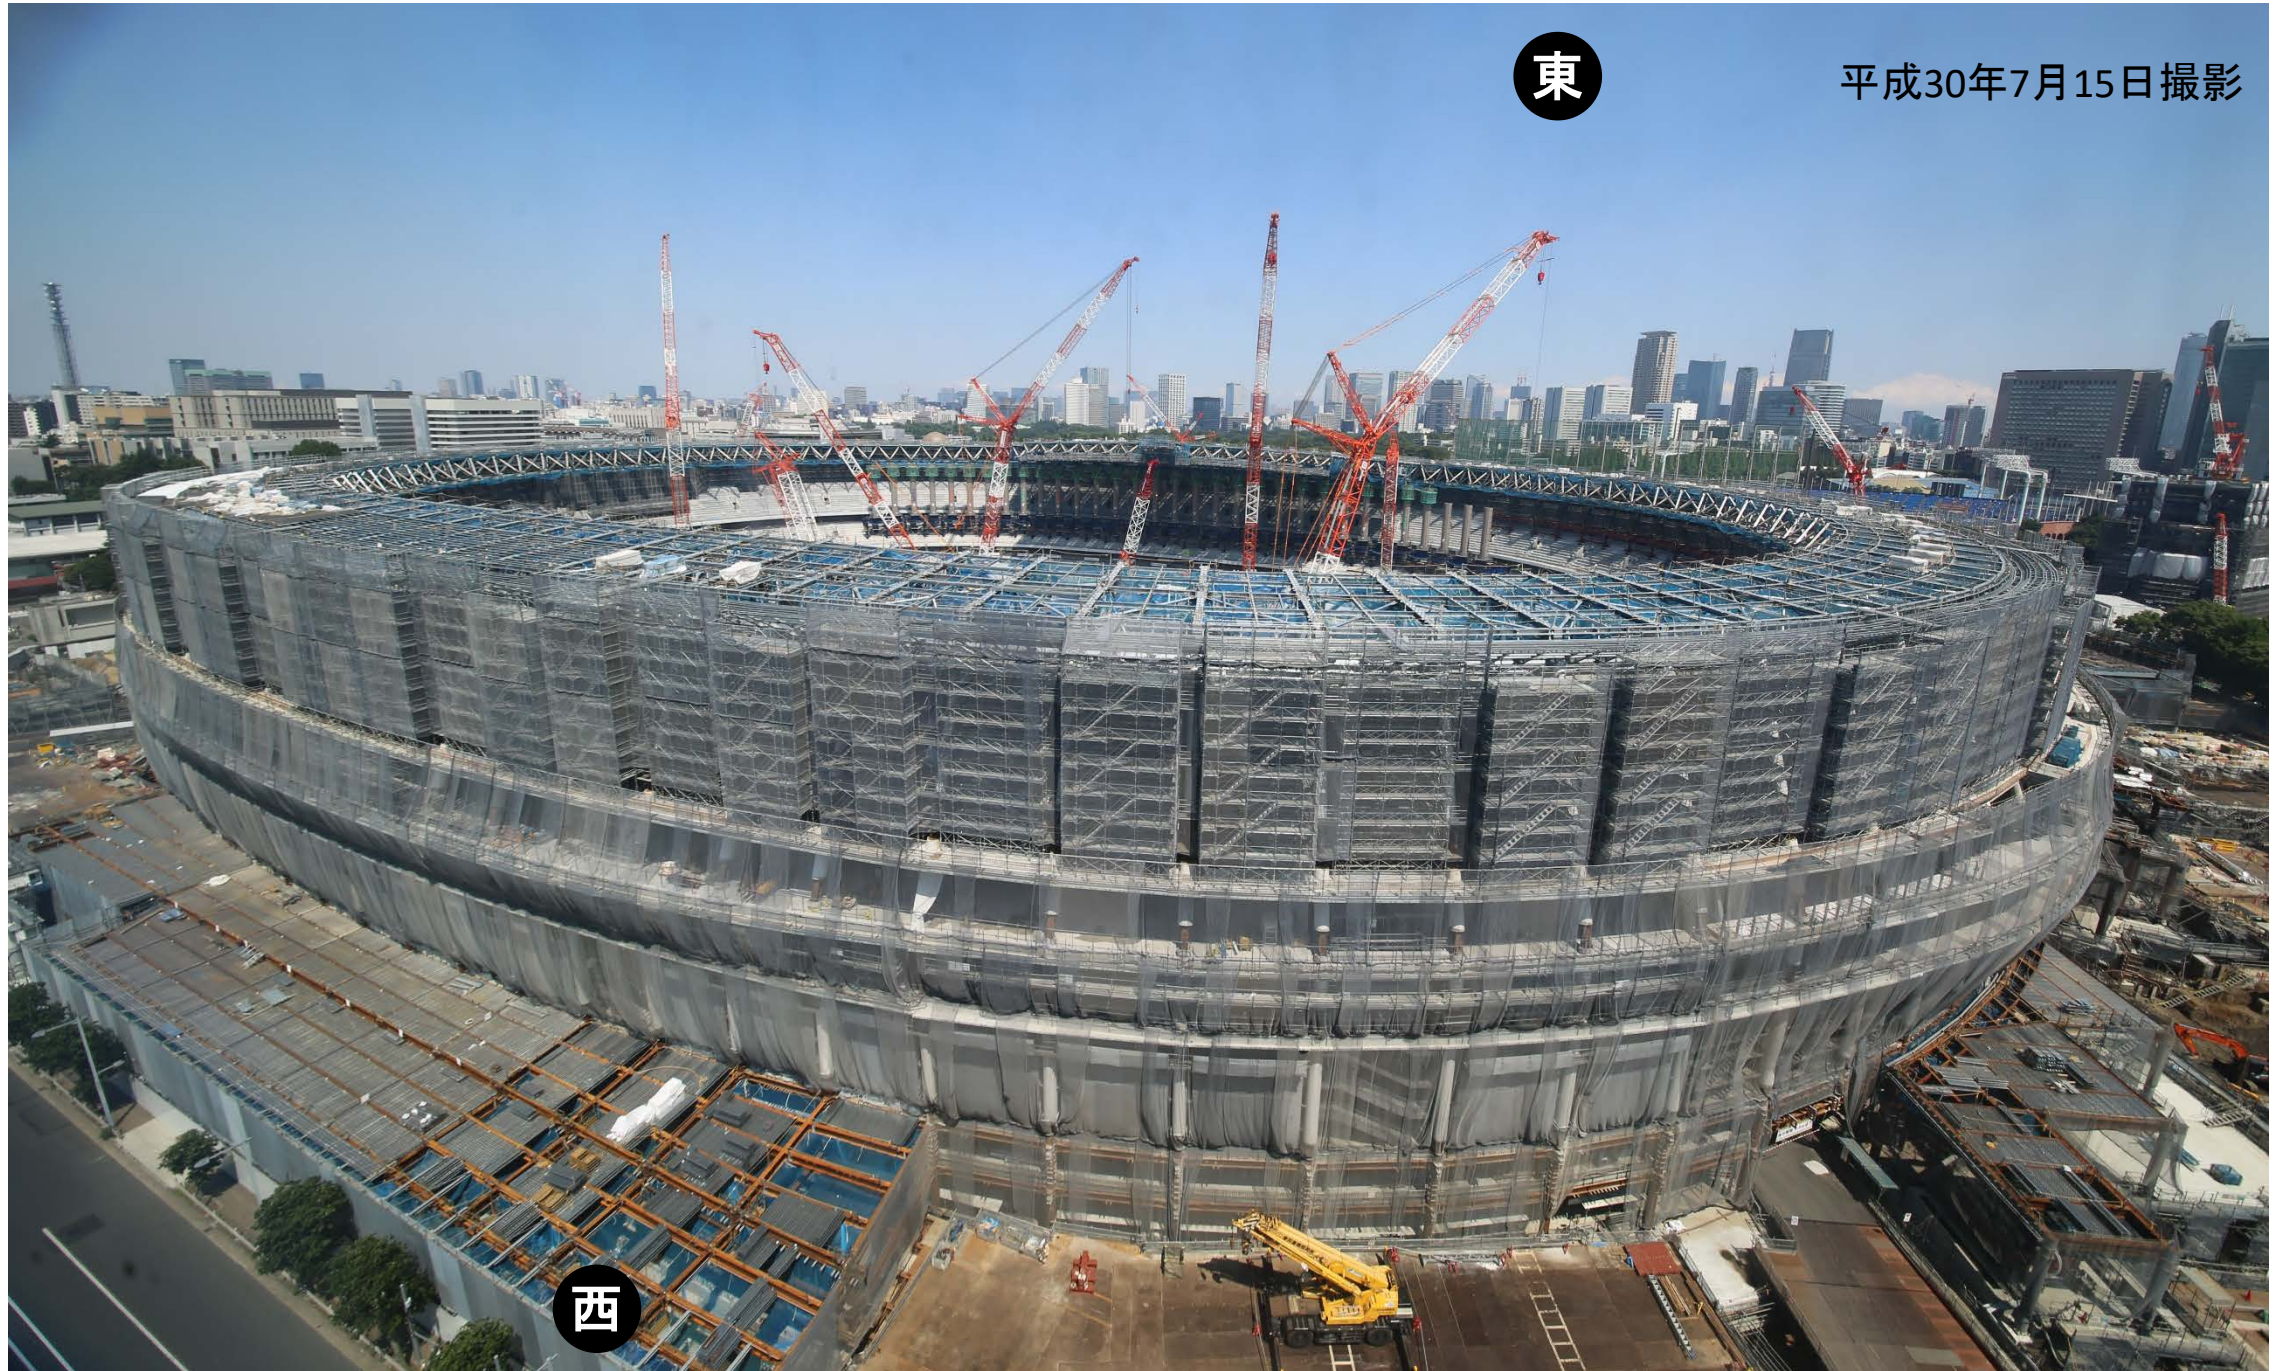


工事進捗状況② スタンド北側

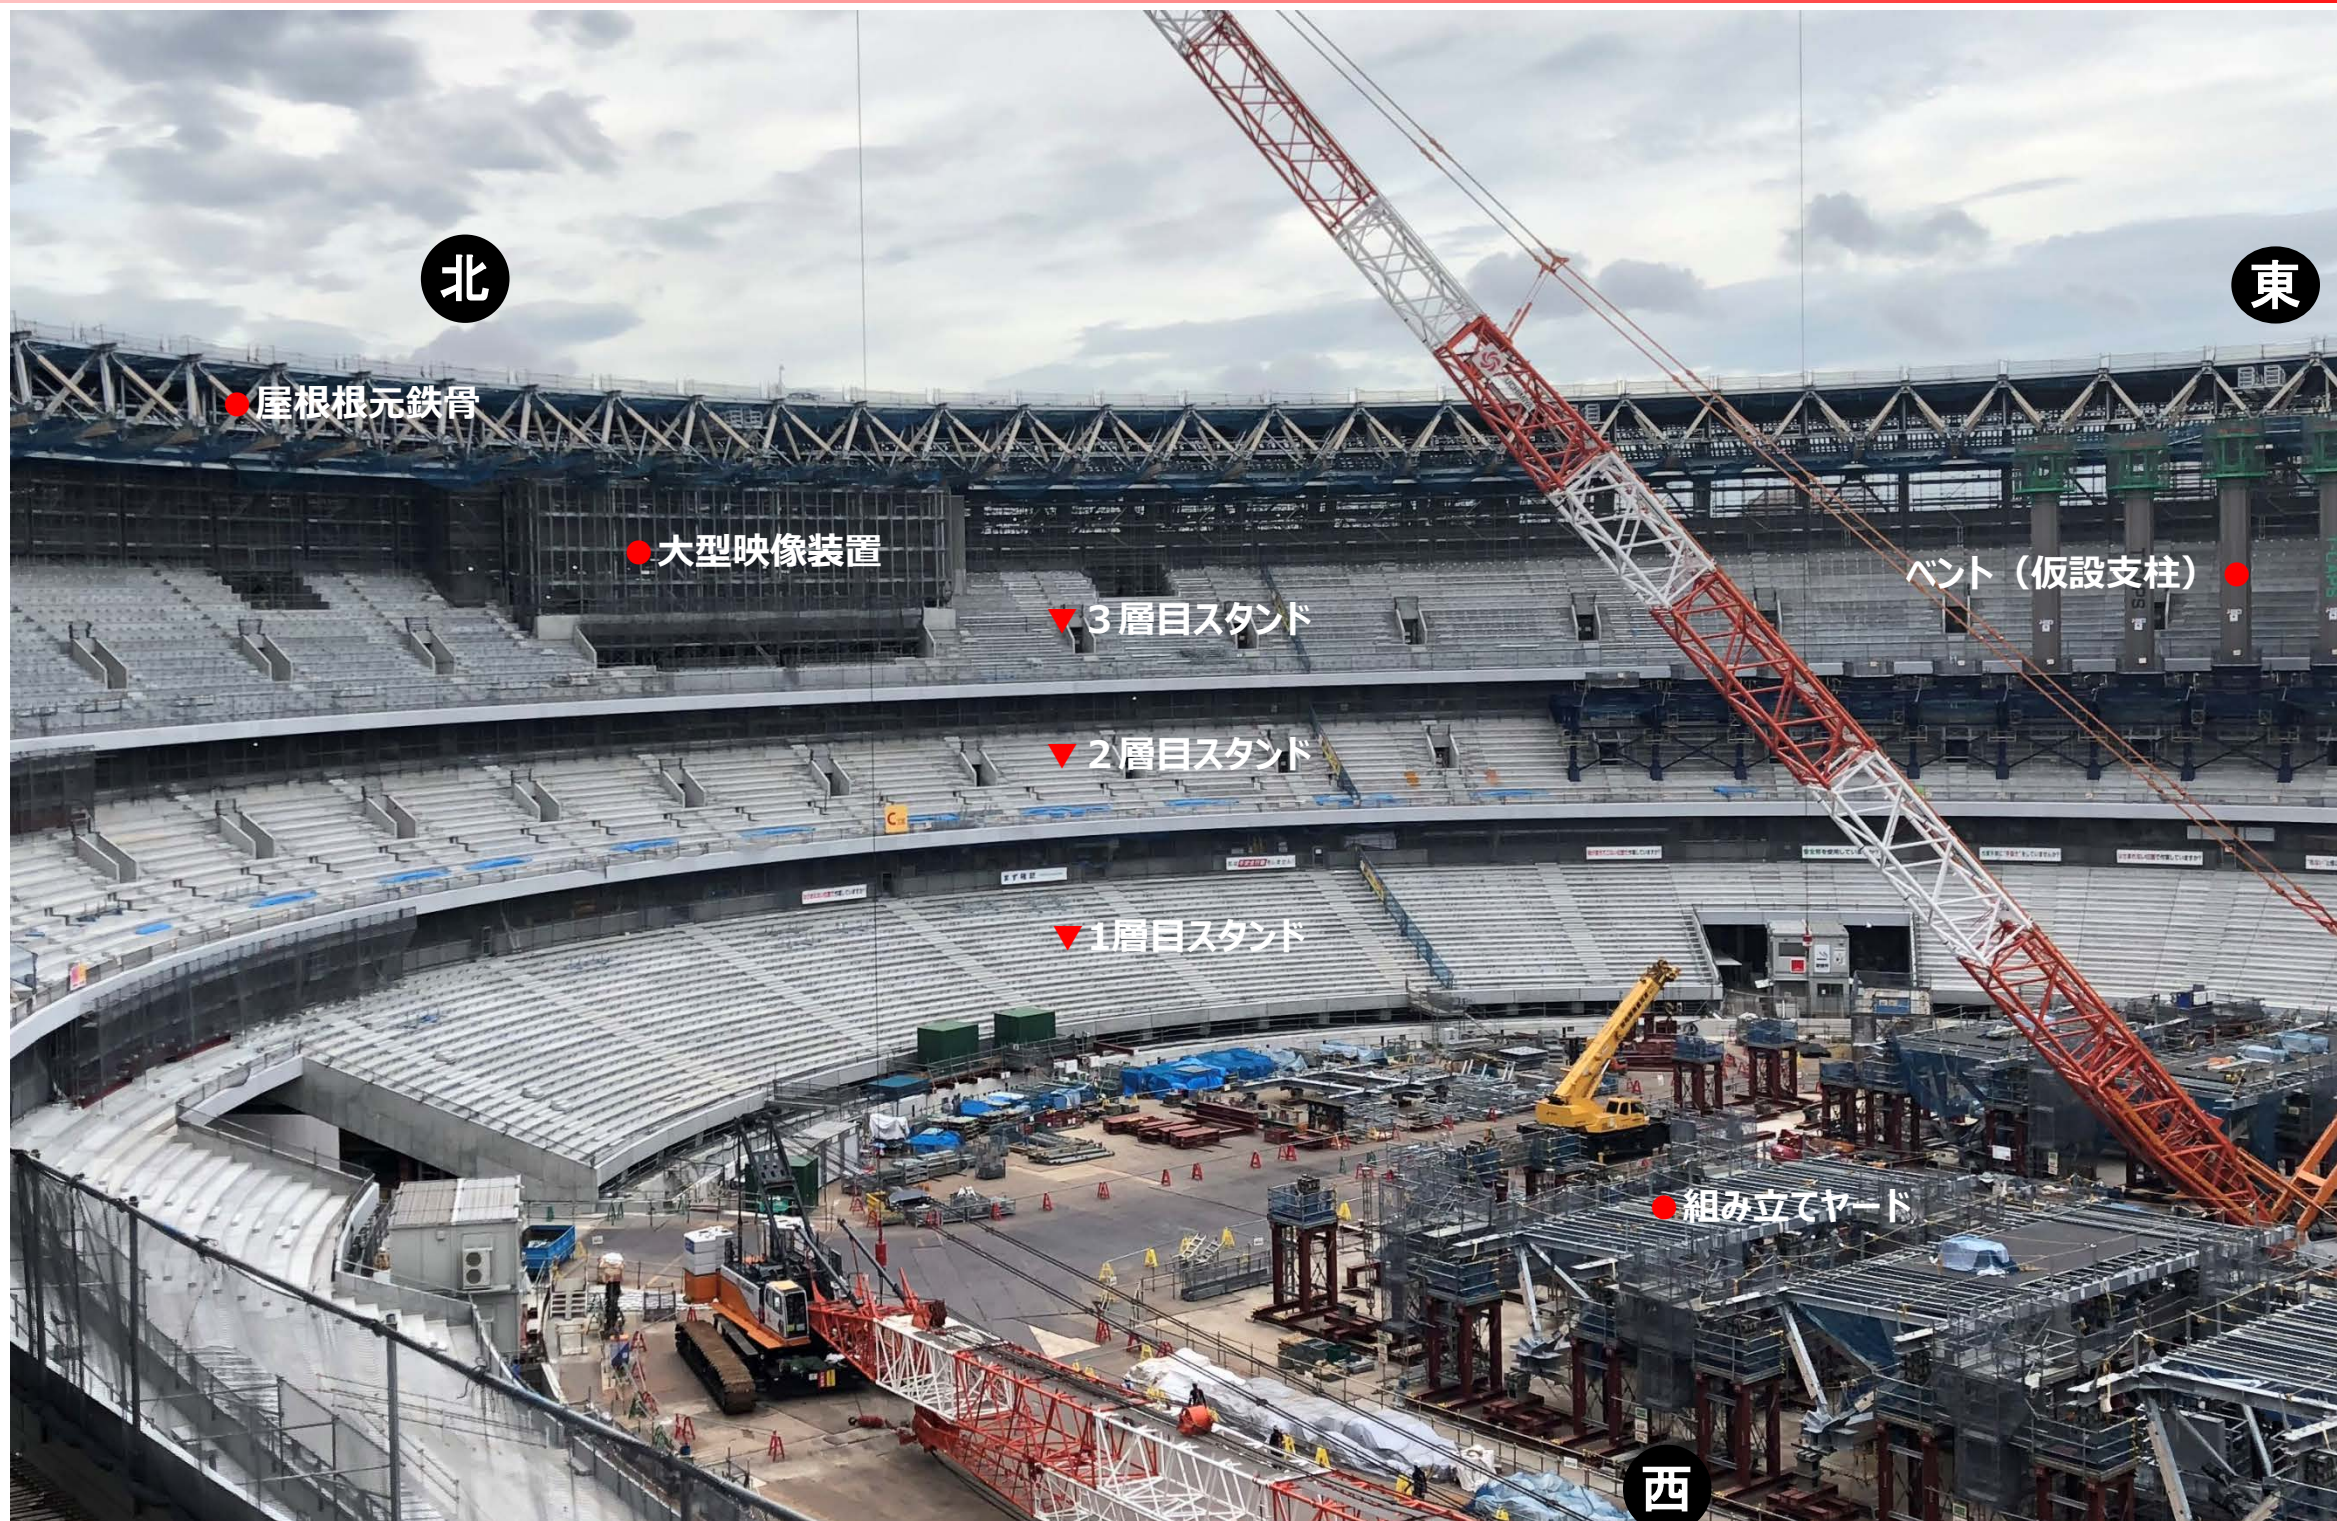

工事進捗状況③ スタンド南側

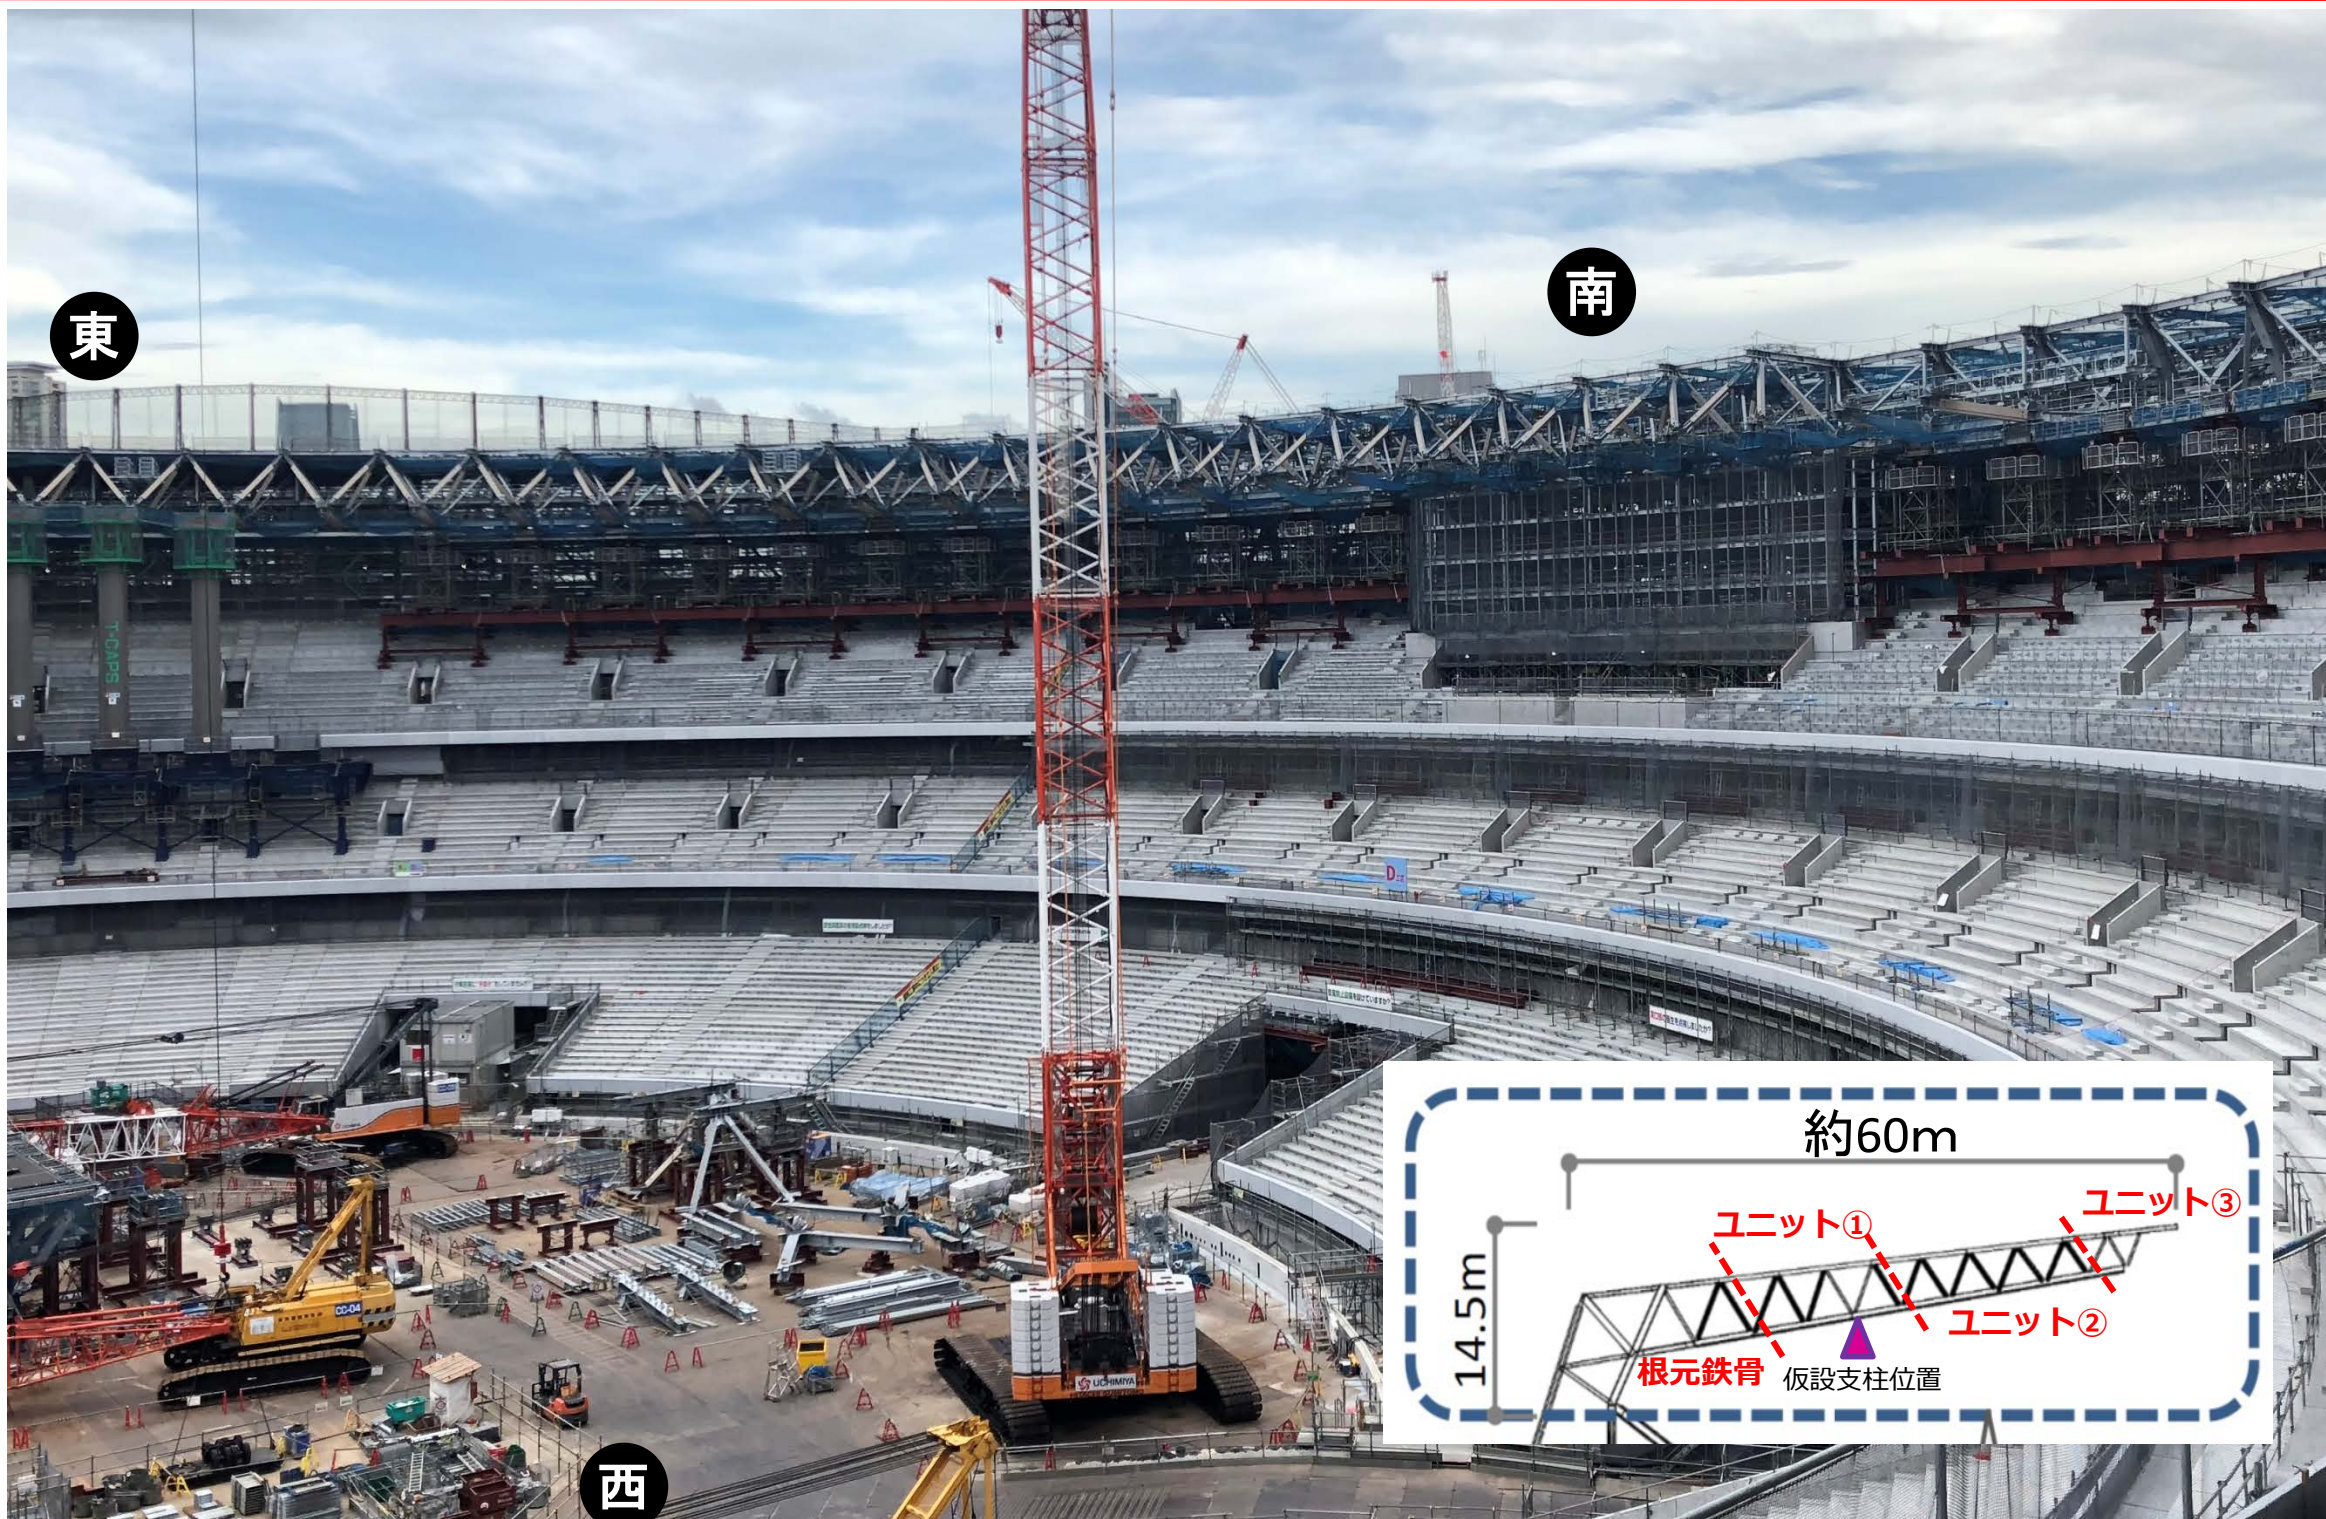


工事進捗状況④ 1階

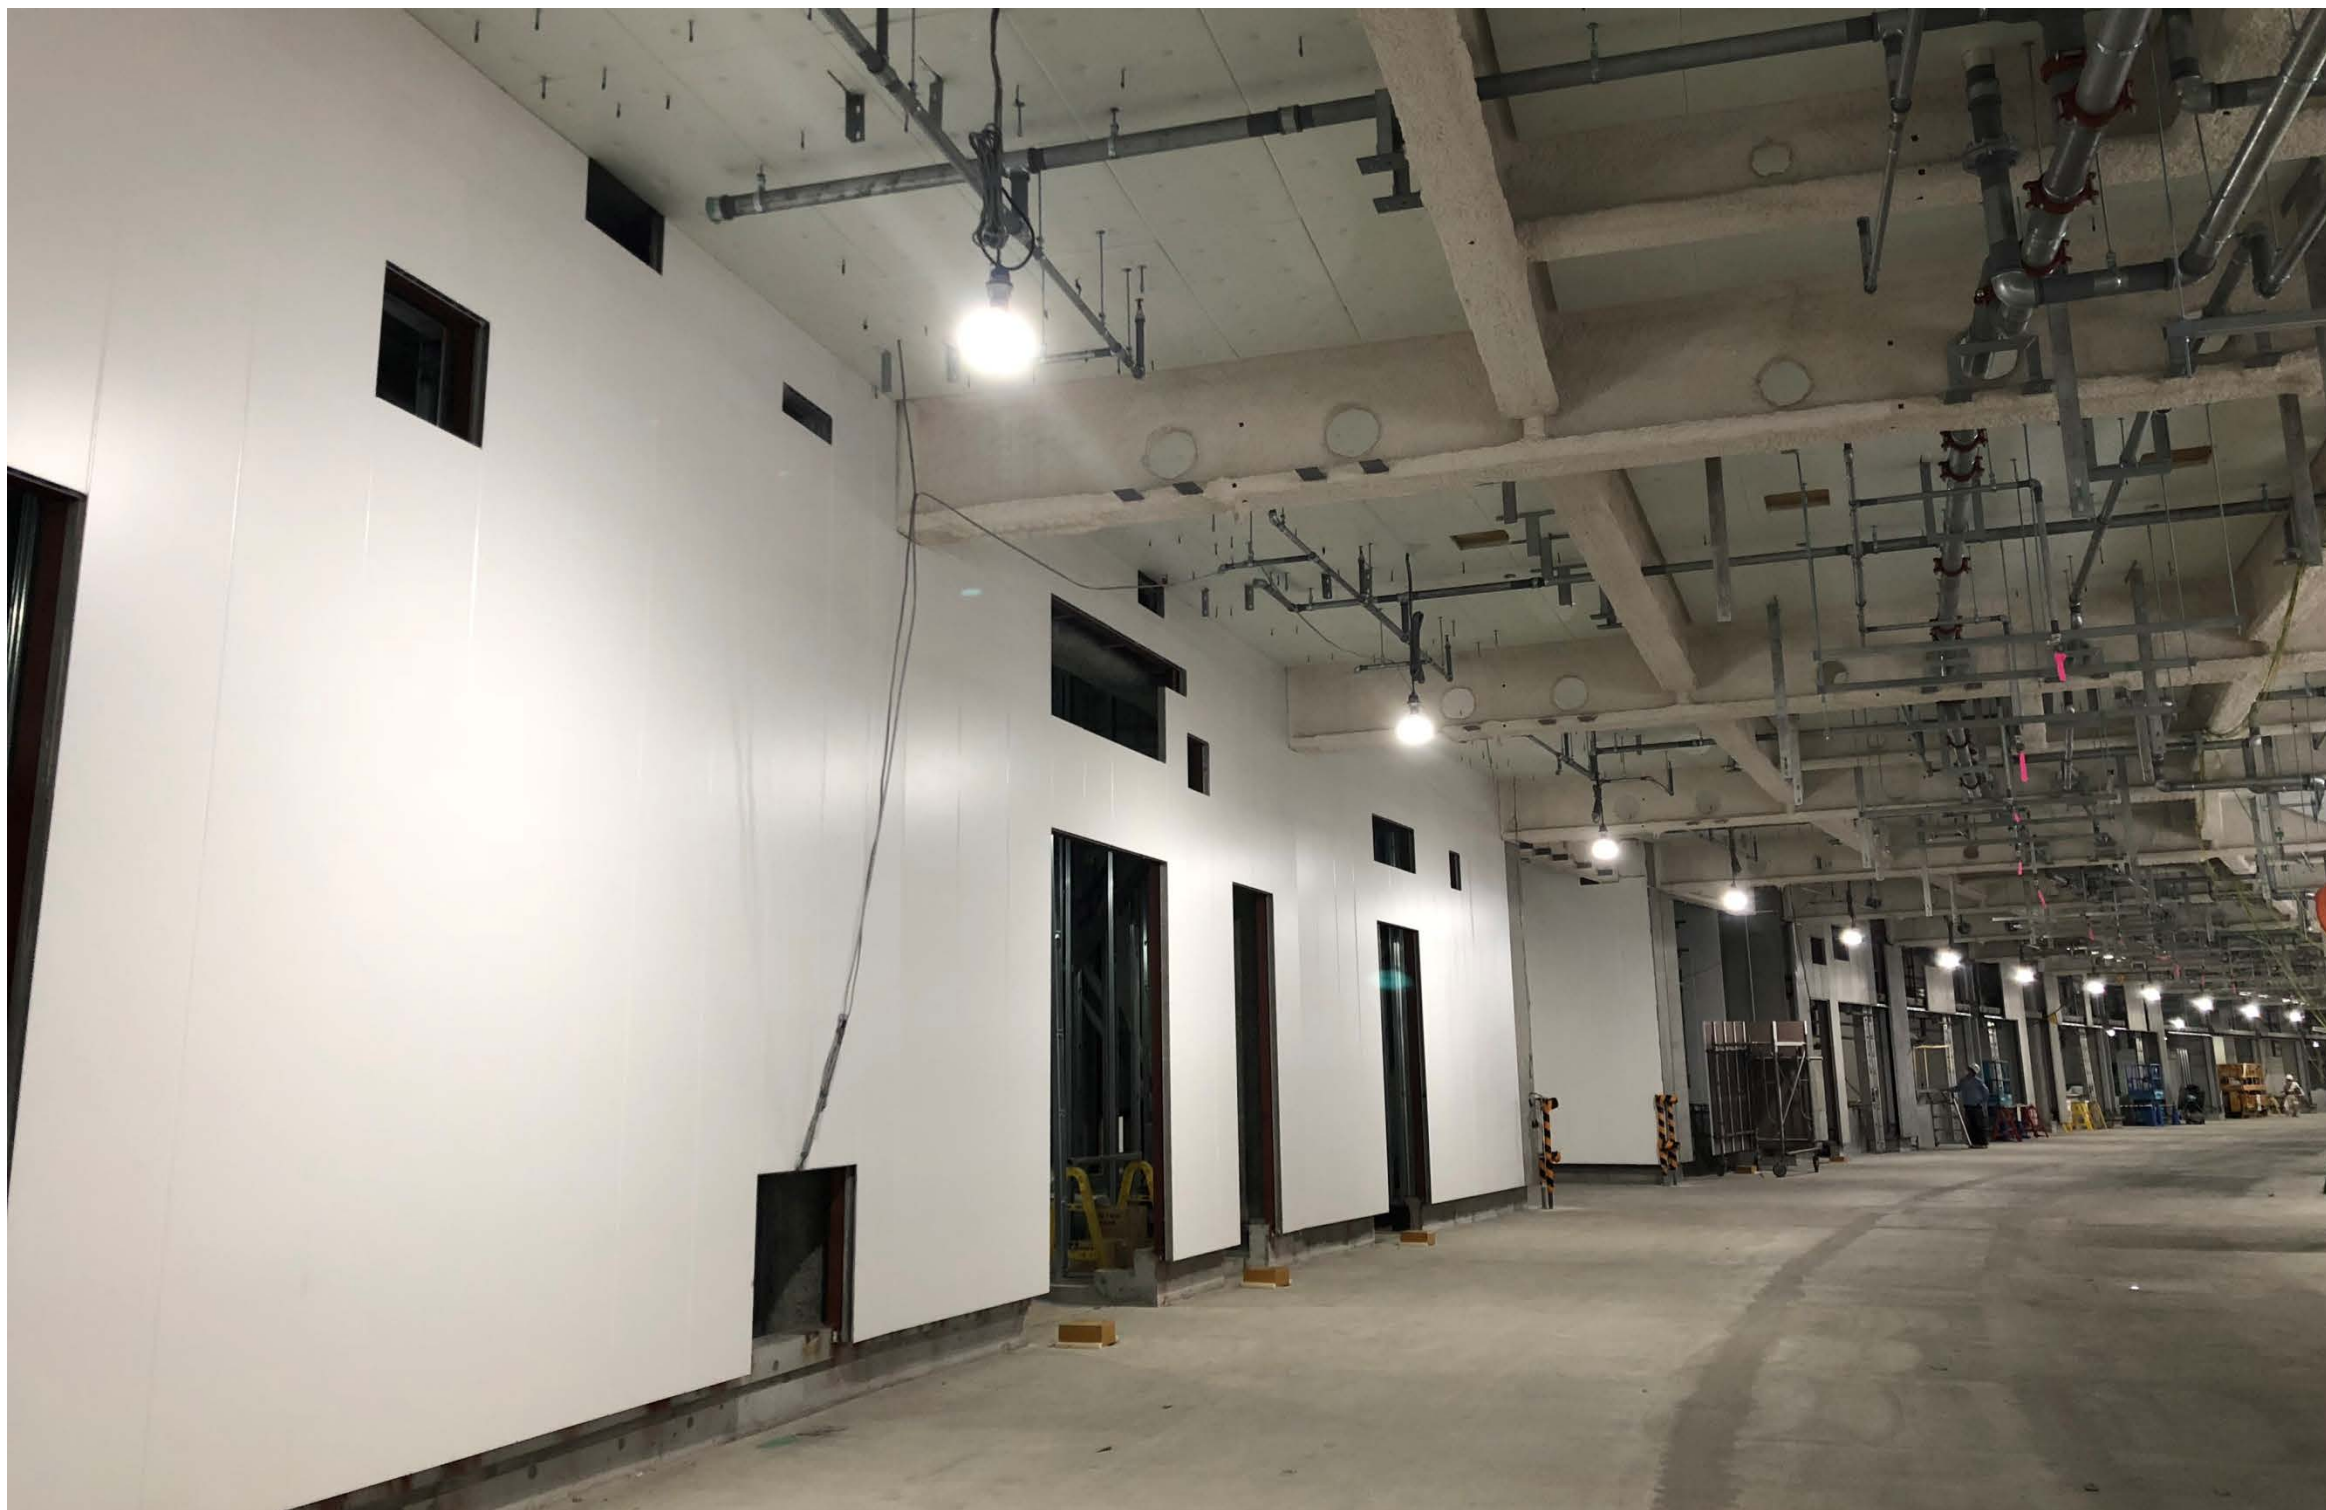

工事進捗状況⑤ 3層目スタンド



工事進捗状況⑥ 風の大庇：アルミルーバー（北東面）

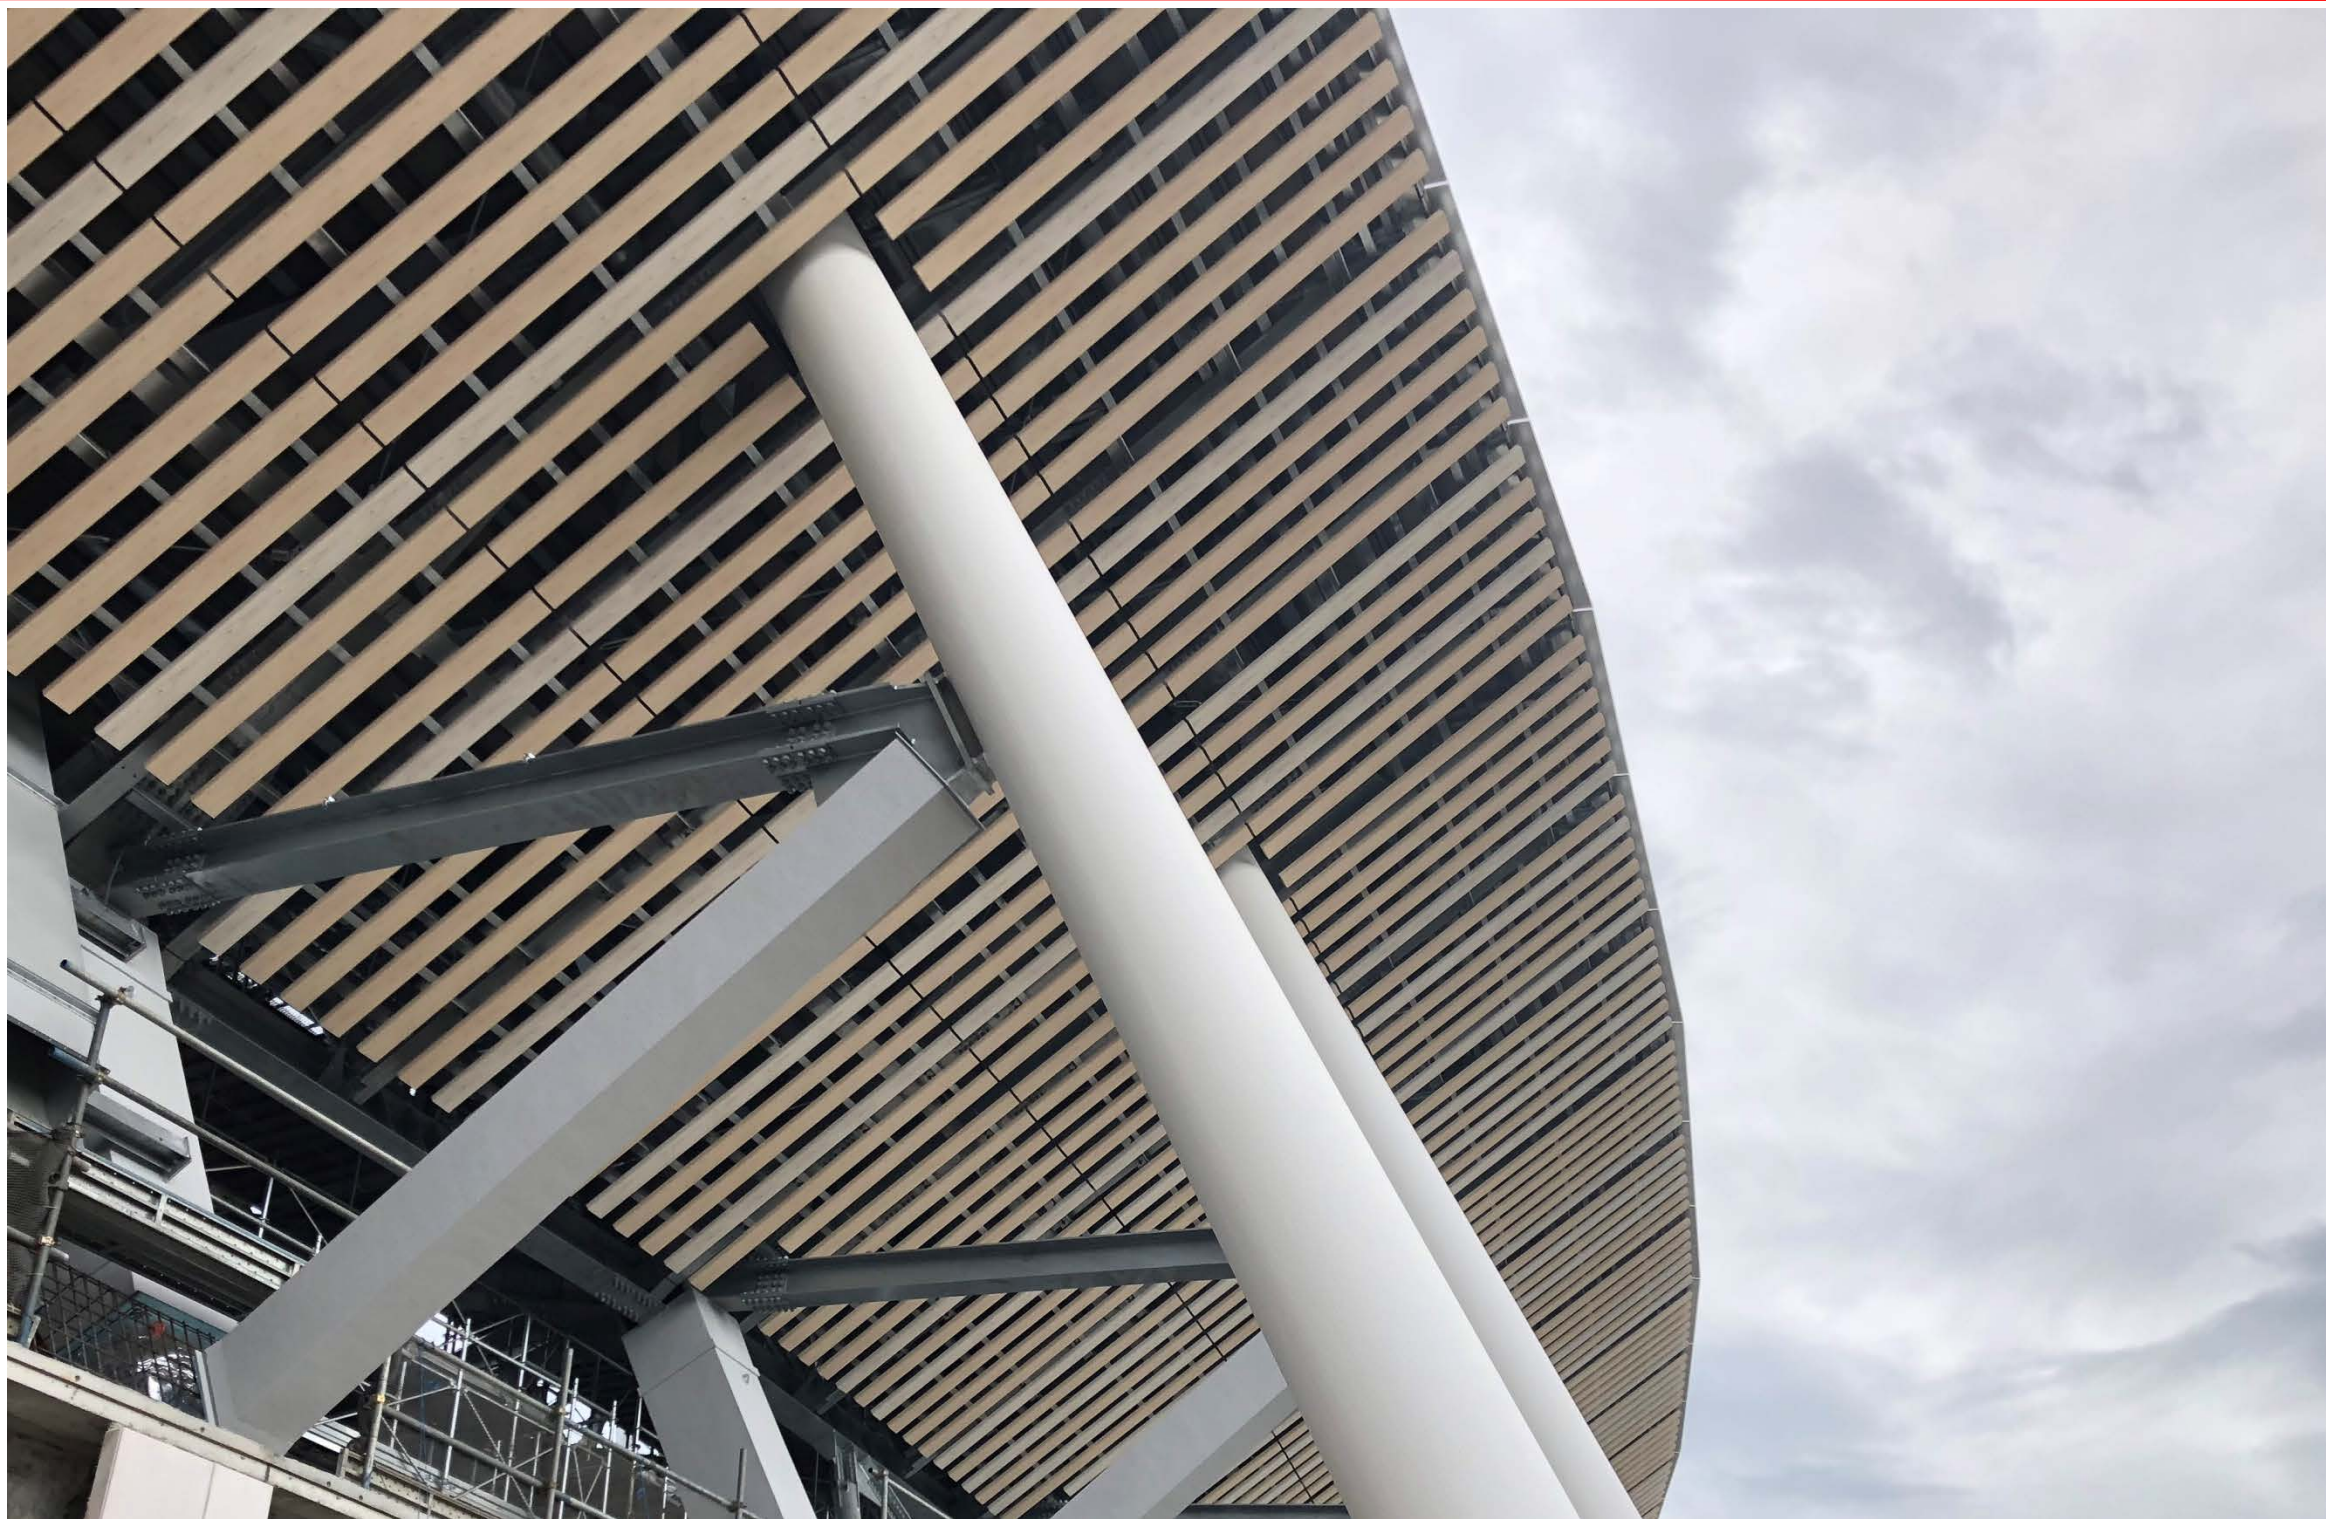

工事進捗状況⑦ 軒庇：スギ



工事進捗状況について（ポイント）

全体について

- 全体工期36か月（2016年12月～2019年11月）のうち20か月目に入り、工事は当初の計画通りに進んでいる。
- 現在の作業員数は、約2000名程度。
- 木材の全体使用量は、2千立方メートル程度（技術提案時）。

屋根工事について

- 屋根鉄骨には、鉄骨と木材を組み合わせたハイブリッド構造※を採用し、「国産木材の利用による世界に誇れるスタジアム」として、国産木材（森林認証を取得したカラマツ（下弦材）及びスギ（ラチス材））を積極的に活用している。

※十分な強度のある鉄骨を主体としつつ、地震や強風による変形を抑えるため木材を組み合わせたもの。

- 今年2月から着手し、2019年5月中頃に終える予定。
- 根元鉄骨の先に3つのユニット鉄骨を取り付けると、屋根の長さは約60m。屋根全体の重さは約2万トン。
- 平成30年7月11日現在で、根元鉄骨108／108スパン、ユニット①17／108、ユニット②11／108スパン、ユニット③1／36スパンが終了。
